

Estado de cumplimiento del Plan de Acción Específico y Solicitud de Prórroga



Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



Diciembre de 2023



Temas

1. Generalidades: Plan de Acción Específico
2. Actividades del Plan objeto de recomendación de cierre
3. Actividades del Plan a implementarse en 2024-2025
4. Resumen general





1. Generalidades Plan de Acción Específico



- **Objeto de la reunión:** Recomendación de cierre de actividades y ampliación de plazo por dos (2) años, de acuerdo a la solicitud radicada al DAGRAN en febrero 2023 (radicado 20230130025308).
- **Disminución del riesgo:** Entrada en funcionamiento de 4 turbinas.
- **Actividades a ejecutar 2024 - 2025:** 21 actividades (14% de avance faltante). Estas dependen de aprobación de autoridades ambientales y entes de control.

El Plan de Acción Específico (PAE) tiene el propósito de atender las necesidades de las comunidades de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí afectadas por la contingencia ocurrida en el 2018 de una forma integral y vinculante.

EPM es responsable de 86 actividades y a diciembre de 2023 se ha gestionado el cumplimiento de 65 actividades.



1. Generalidades Plan de Acción Específico



12

Municipios en
área
de influencia

4

Municipios aguas abajo

- **TARAZÁ**
- **CÁCERES**
- **CAUCASIA**
- **NECHÍ**

16

Municipios
de interés



Decreto de Calamidad Pública incluyó los municipios de área de influencia y 4 municipios aguas abajo de la presa
D2018070001272 del 14 mayo de 2018.

Decreto de levantamiento de la calamidad
D2019070002605 del 17 mayo 2019 en el que se establece el PAE.

Resolución 1056 del 4 noviembre de 2022 emitida por la UNGRD – Fortalecimiento Gestión del Riesgo de Desastres

Atención sentencia T-38 - Río Cauca sujeto de Derechos con alcance a región de La Mojana.

Resolución 0185 de 2019 y 615 de 2023 ANLA – Temas ambientales



1. Generalidades Plan de Acción Específico

Líneas de trabajo PAE




Social



Vivienda




Accesibilidad
y transporte



Salud




Servicios
públicos



Educación



Medios de
vida



Ambiental



Comunicación






1. Generalidades Plan de Acción Específico



AVANCE POR LÍNEA DE ACCIÓN

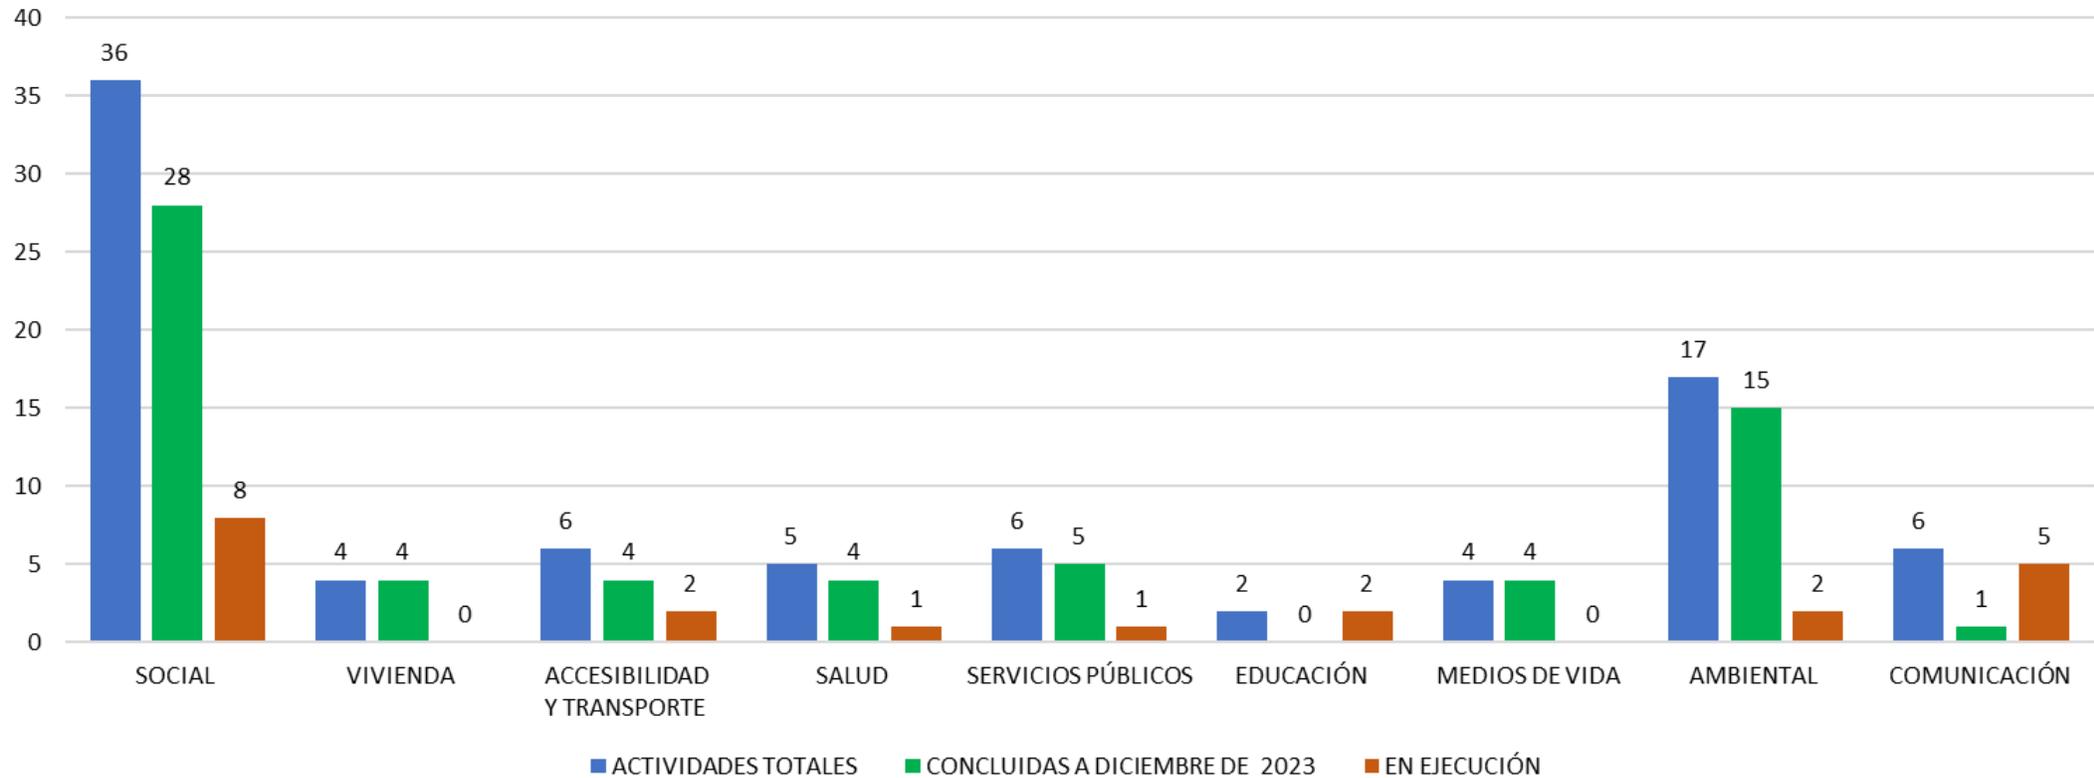

86

65

21





1. Generalidades Plan de Acción Específico

Principales acciones 2019-2023



3

Puentes:

Puente El 12 (Tarazá), Puente Simón Bolívar (Valdivia) y Puente La Paulina (Valdivia)



9

Mantenimientos y reparaciones a Centros Educativos



1

Servicio de Ambulancia Puerto Valdivia con **2965** atenciones



18

Viviendas indígenas en resguardo Carupia - Tarazá



1. Generalidades Plan de Acción Específico

Principales acciones 2019-2023



230

Kits de emergencia entregados



326

Rutas de evacuación (señalética, mantenimientos)



88

Sistemas de Alarma instalados



412

Simulacros con las comunidades (38.629 asistentes)



885

Talleres en fortalecimiento y gestión del riesgo y divulgaciones

23

Planes comunitarios para la Gestión del Riesgo de Desastres

84

Puntos de encuentro

1. Generalidades Plan de Acción Específico

Principales acciones 2019-2023



250

Estudiantes beneficiados con transporte escolar



9

Plantas de potabilización instaladas



106

Voceros comunitarios
128 líderes: formulación de proyectos



1

Centro de Monitoreo Técnico
(análisis primario de 3000 variables aprox. de la central)



2255

Familias evacuadas

75

Organizaciones solidarias fortalecidas (1414 asociados)



2770

líderes capacitados

857

Talleres psicosociales

2490

Apoyos psicosociales (19502 personas atendidas)





2. Actividades para recomendación de cierre





Actividades para recomendación de cierre



Línea	Totales	Con recomendación de cierre	Concluidas A Diciembre de 2023	En Ejecución
Social	36	8	28	8
Vivienda	4	1	4	0
Accesibilidad y Transporte	6	-	4	2
Salud	5	-	4	1
Servicios Públicos	6	-	5	1
Educación	2	-	0	2
Medios de Vida	4	-	4	0
Ambiental	17	5	15	2
Comunicación	6	-	1	5
Total	86	14	65	21





2. Actividades para recomendación de cierre



No.	CÓDIGO PAE	LÍNEA PAE	ACTIVIDADES
1	138	Línea Vivienda	Valdivia: Restitución de condiciones de vida a familias afectadas totalmente por el evento del 12 de mayo
2	142	Línea Social	Apoyos económicos a evacuados de Puerto Valdivia
3	143	Línea Social	Ejecución del protocolo de retorno
4	158	Línea Ambienta	Acciones socioambientales enfocadas en: actividad pesquera, limpieza y mantenimiento de caños y ciénagas, actividades de restauración de cobertura vegetal e implementación de viveros.
5	162	Línea Ambiental	Realizar la caracterización fisicobiótica y socioambiental de los complejos cenagosos del Bajo Cauca antioqueño en jurisdicción de Corantioquia que sean priorizados por la Corporación.
6	163	Línea Ambiental	Implementar e instrumentar una red de monitoreo que permita hacer seguimiento a la calidad fisicoquímica e hidrobiológica, caudales y niveles del agua, que incluya el río Cauca, algunos tributarios y las ciénagas, localizados en el Bajo Cauca antioqueño en jurisdicción de Corantioquia.
7	164	Línea Ambiental	Fomentar e incentivar la creación de un programa social de 90 Guardaciénagas con comunidades locales asociadas a los ecosistemas cenagosos.





2. Actividades para recomendación de cierre



No.	CÓDIGO PAE	LÍNEA PAE	ACTIVIDADES
8	166	Línea Ambiental	Creación de colección viva de peces del Río Cauca (Acuario Parque Explora)
9	185	Línea Social	Laboratorios sociales: desarrollo de proyectos de innovación social en los territorios, liderados por las JAC.
10	194	Línea Social	Estudio de riesgos reales y potenciales en derechos humanos con ocasión del cierre de la compuerta de captación 1. •Análisis de información, evaluación de riesgos •Actualización de matriz de riesgos sociopolíticos y de DDHH •Formulación de estrategias y acciones para la mitigación de riesgos – recuperación.
11	197	Línea Social	Articulación interinstitucional con las instancias responsables de la protección y promoción de los DDHH y el cumplimiento del DIH.
12	198	Línea Social	Apoyo al enrutamiento institucional y a la generación de medios de vida y cocreación de rutas de prevención en derechos humanos con líderes comunitarios (enfocados en salud, medio ambiente, condiciones de vida digna).
13	199	Línea Social	Apoyo al fortalecimiento de comunidades étnicas (procesos de reconocimiento, organización, espacios de participación)
14	206	Línea Social	Atención de actividades sociales y de infraestructura para las comunidades indígenas



2. Actividades para recomendación de cierre



AUNAP Corantioquia



148 - Requerimiento AUNAP:

Proyectos productivos para la comunidad de pescadores.

Auto de 2020: Ordenación de la pesca

Resolución 079 del 21 enero de 2022: Pesca en el embalse del PHI

EPM entrega de la información y apoyo en el proceso de ordenación de la pesca.

Proyectos productivos dependerán del avance de la ordenación de la pesca.

➤ 159 - Requerimientos Corantioquia:

Delimitación de rondas hídricas.

Artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y **Artículo 83** del **Decreto Ley 2811** de 1974, reiterado en el **Decreto 2245** de 2017, dicha función está delegada de manera exclusiva a las Corporaciones Autónomas.

EPM ha cumplido con la entrega de información

3. Actividades del Plan a implementarse en 2024-2025



Actividades continuidad 2024-2025

- Salud
- Infraestructura
- Social
- Ambiental
- Comunicaciones



132 Infraestructura Escolar Marco A Rojo:

Contrato CRW118463

Plazo estimado: 420 días calendario

Inversión estimada: COP \$6.579.672.423

177 Centro de Salud Puerto Valdivia:

Contrato CRW118463

Plazo estimado: 420 días calendario

Inversión estimada: COP \$6.686.011.829

Avances: Compra predio sector Remolinos, en el corregimiento de Puerto Valdivia. Se tienen los diseños aprobados y el proceso de contratación en curso, se está a la espera de los permisos, trámites y licencias ambientales que se resuelvan por parte de las autoridades competentes. y expedición de licencia de construcción.



151 Puente Palestina:

Contrato CRW279473

Plazo Estimado: 270 días calendario

Inversión estimada: COP \$ 8.192.046.920

Beneficios comunidad: Rehabilitación del Puente Palestina y construcción de obras complementarias, en atención del Plan de Acción Específico del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

151 Puente el Turcó:

Contrato: CRW269064

Plazo Estimado: 360 días calendario

Inversión: COP \$ 14.448.038.582

Beneficios comunidad: Rehabilitación del Puente el Turcó y construcción de obras complementarias, en atención del Plan de Acción Específico del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.



151 Puente La Garrucha Sabanalarga:

Contrato: Se encuentra en etapa de diseño para definir cantidades, valores y duración

Plazo Estimado: Por definir

Inversión: COP \$20.000.000.000

Inconvenientes : Se encuentra pendiente de contratar los diseños y la ejecución del mismo

153 Rescate Puente Simón Bolívar:

Contrato: Se encuentra en etapa de diseño

Plazo Estimado: 150 días calendario

Inversión estimada: COP \$2.500.000.000

Inconvenientes : Complejidad técnica para la remoción del puente, solicitud de terminación de contrato por parte del contratista que realizaría la extracción por imposibilidad de entrar embarcaciones con el calado necesario para la extracción.



Actividades 141 y 196: Las cuales incluyen apoyo Psicosocial a las comunidades y el Monitoreo y seguimiento en campo de entorno sociopolítico:

Contrato CRW278698

Plazo Estimado: 730 días calendario

Inversión: COP \$7.275.434.723

Avances: Está en preparación la documentación contractual con solicitud de único oferente, el cual tendrá inicio estimado a finales de enero, continuando lo que se realiza mediante el contrato CW246684 que se ejecuta actualmente.

Beneficios comunidad: Ejecutar programas y proyectos de intervención social integral con las poblaciones afectadas por la emergencia del proyecto Hidroeléctrico Ituango para el restablecimiento de las condiciones de vida de las familias

Inconvenientes pasados:



Actividad 165

Estudio ecosistémico e implementación de la recuperación aguas abajo de la presa:

Contrato Restauración de ecosistemas en el plano de Inundación

Plazo Estimado: 3 años

Inversión: 28.000.000.000

Avances: restauradas 170 hectáreas den el bajo Cauca

Beneficios comunidad: Conservación y recuperación de ecosistemas

Inconvenientes pasados: Se han emitido 3 resoluciones asociadas



Estrategia de relacionamiento y comunicaciones:

Actividades 200, 201, 203, 204, 205:

Plazo Estimado: 730 días

Inversión estimada: COP \$4.000.000.000

Acciones actuales: Generación de información pública para la gestión de relacionamiento con medios de comunicación nacionales, locales y comunitario, socialización de avances del plan de recuperación, realización de eventos académicos y visibilización de acciones e infraestructuras ejecutadas.

Beneficios comunidad: Actualización constante de las acciones que EPM realiza en el marco del Plan de Acción Específico para la Recuperación.



4. Resumen



- **Actividades ejecutadas 2019-2023:** 65
- **Actividades a ejecutar 2024 - 2024:** 21
- **Plazo de ejecución:** 2024 – 2025
- **Porcentaje del PAE por ejecutar:** 14%
- **Contratos/convenios necesarios para dar cumplimiento :** >14



GRACIAS
